

都市計画道路日光東京線  
本町口一タリ一交差点

本町中央歩道橋 架換え工事

工事説明資料

令和6年10月更新版


# 工事全体スケジュール(更新)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
歩道橋下部工 (基礎杭等)		← 歩道橋が使用できない期間 →					
歩道橋上部工 (橋脚、桁)			← →				
支障物件移設 (水道、下水、ガス等)		← →					
電線地中化工				← →			
舗装工					← →		
用地買収	→						

(注)当初想定できなかった既設埋設物の処置等により、工事が遅延しています。  
今後も、用地買収の進捗等により、スケジュールを見直す場合があります。


# 工事前後の本町ロータリー交差点

## (1) 着工前

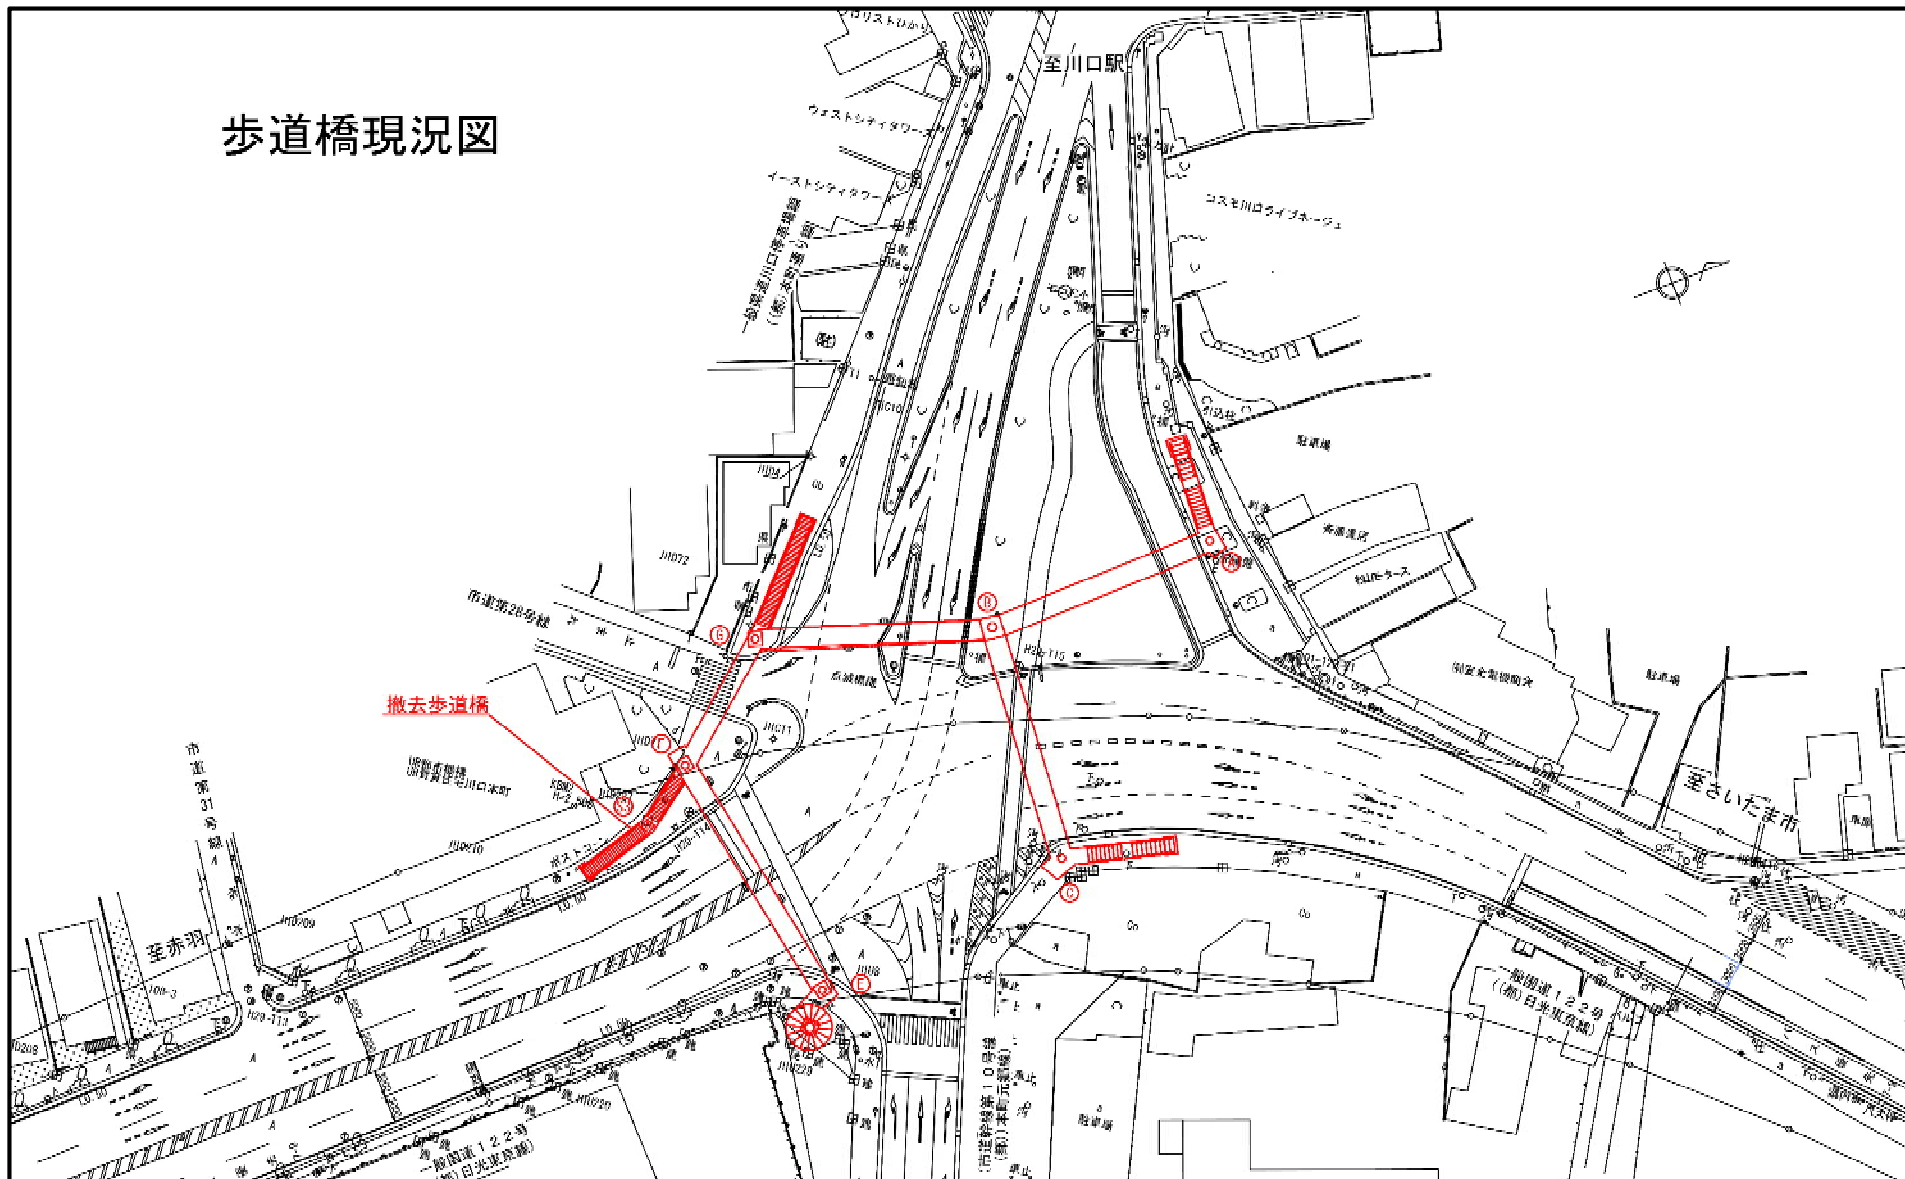


## (2) 現在の歩道橋の撤去時(更新)

予定時期: R6年10月下旬頃

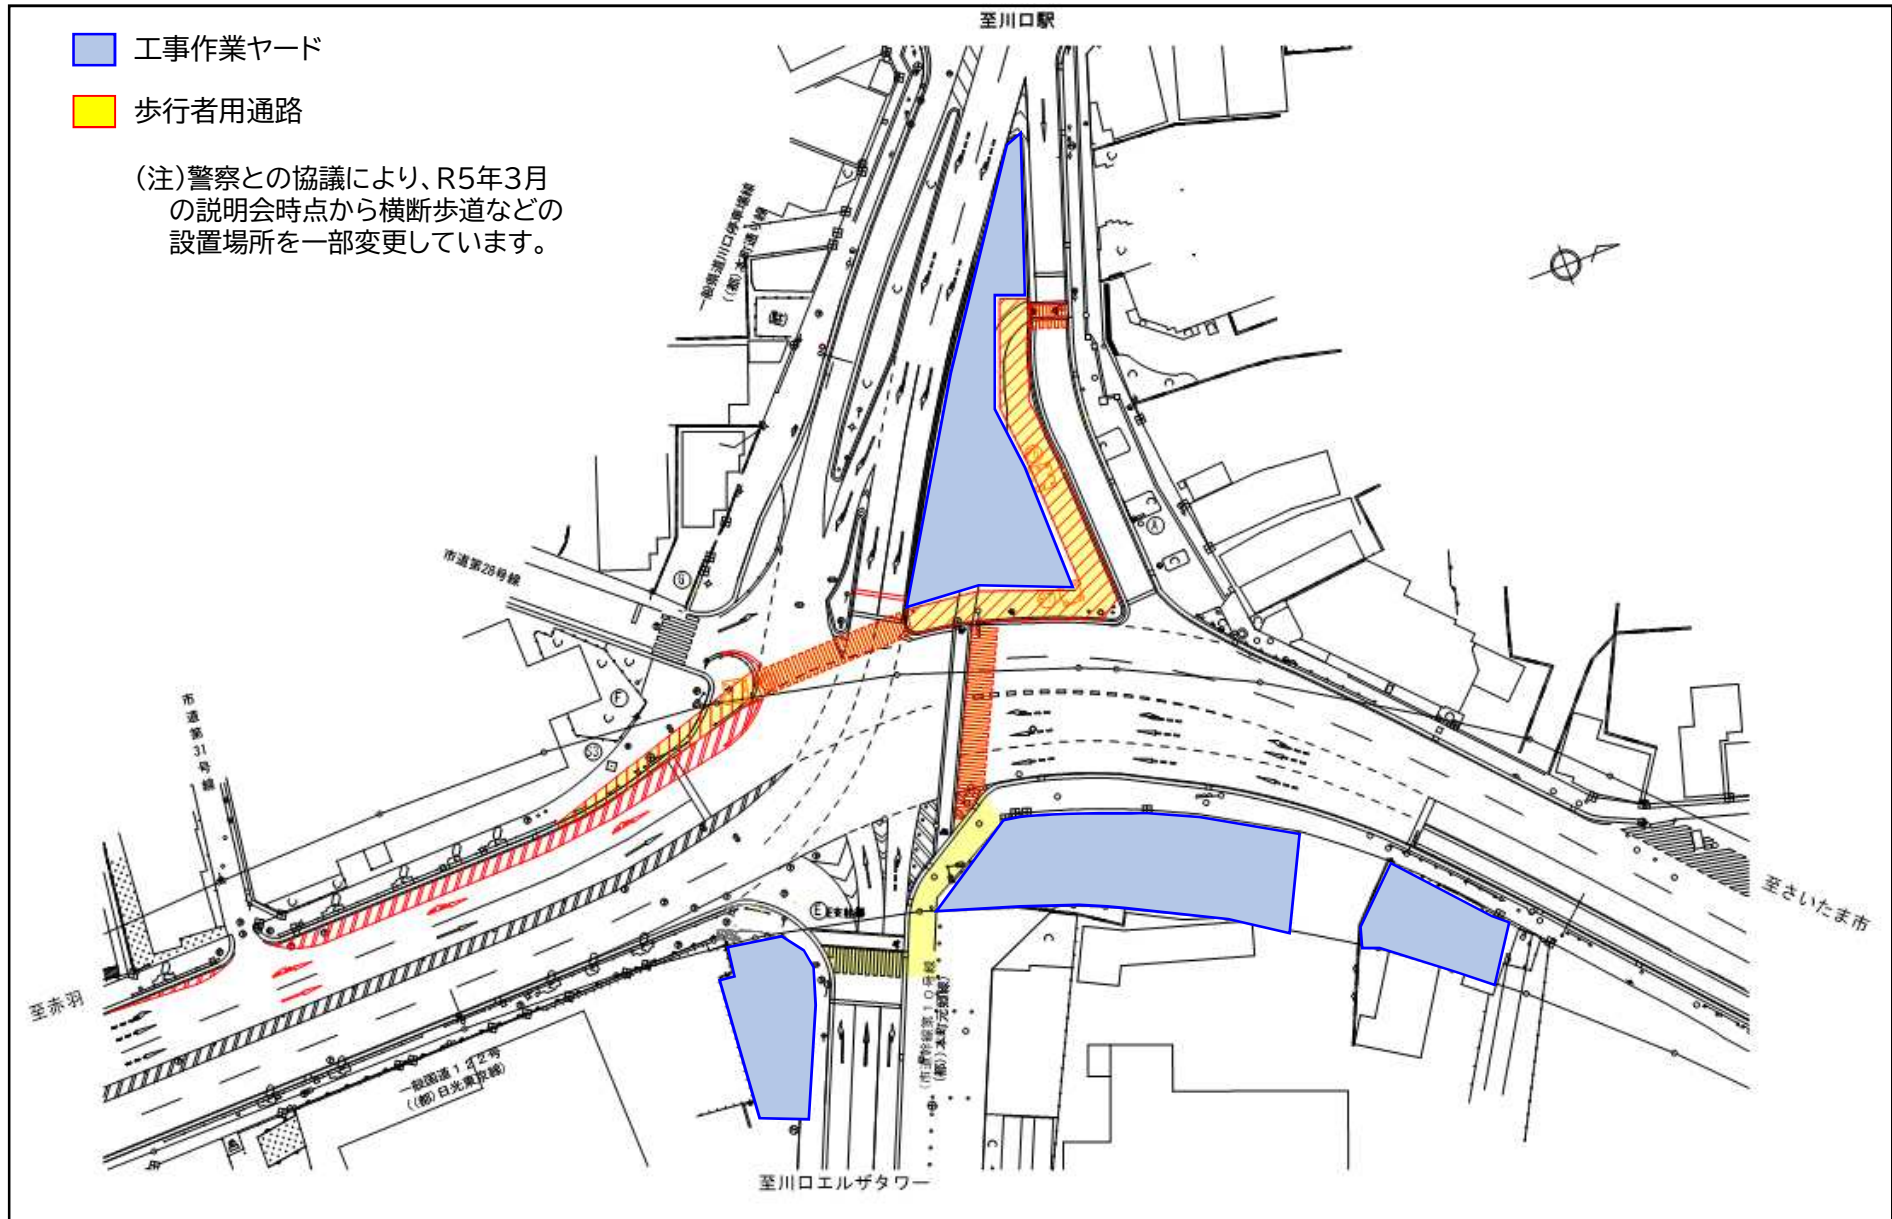

### (3) 整備後

予定時期: R10年3月頃

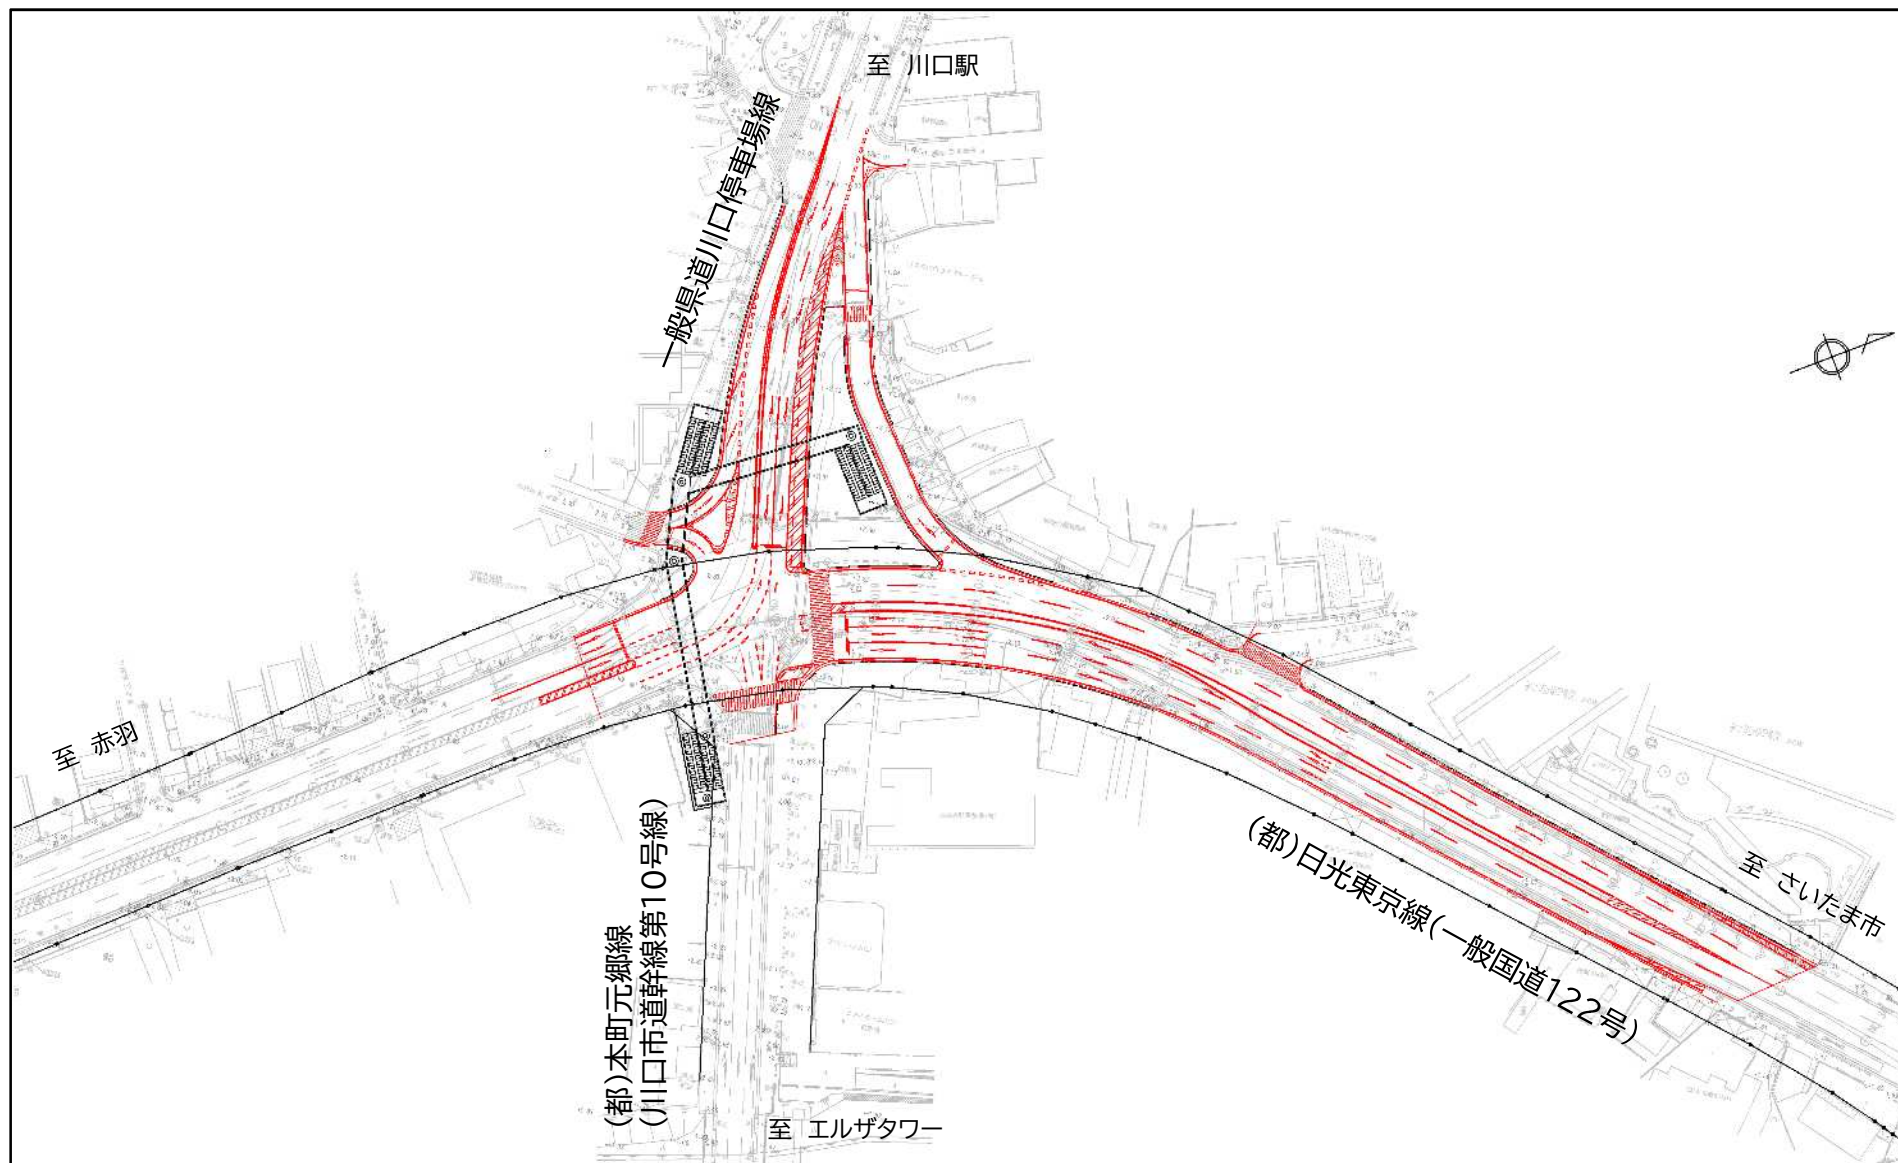

# 工事の流れ

- 各工事段階の状況について、段階(ステップ)ごとに示します。



# ステップ1: 基礎工の施工

施工予定時期: R5年3月中旬～10月下旬

交通島内の新しい横断歩道橋の基礎などを築造します。



## ステップ2: 基礎工の施工2

施工予定時期: R6年1月中旬～3月中旬

本町ロータリ南西角の新横断歩道橋の基礎などを築造します。






# ステップ3: 歩道橋の利用停止(現在の歩道橋撤去の準備)と、仮設横断歩道

利用停止予定期間: R6年4月1日~R8年3月下旬

現在の横断歩道橋を撤去するため、仮の横断歩道などを設置します。

## 仮設横断歩道


(注)警察との協議により、令和5年3月の説明会時点から設置場所を変更しています。

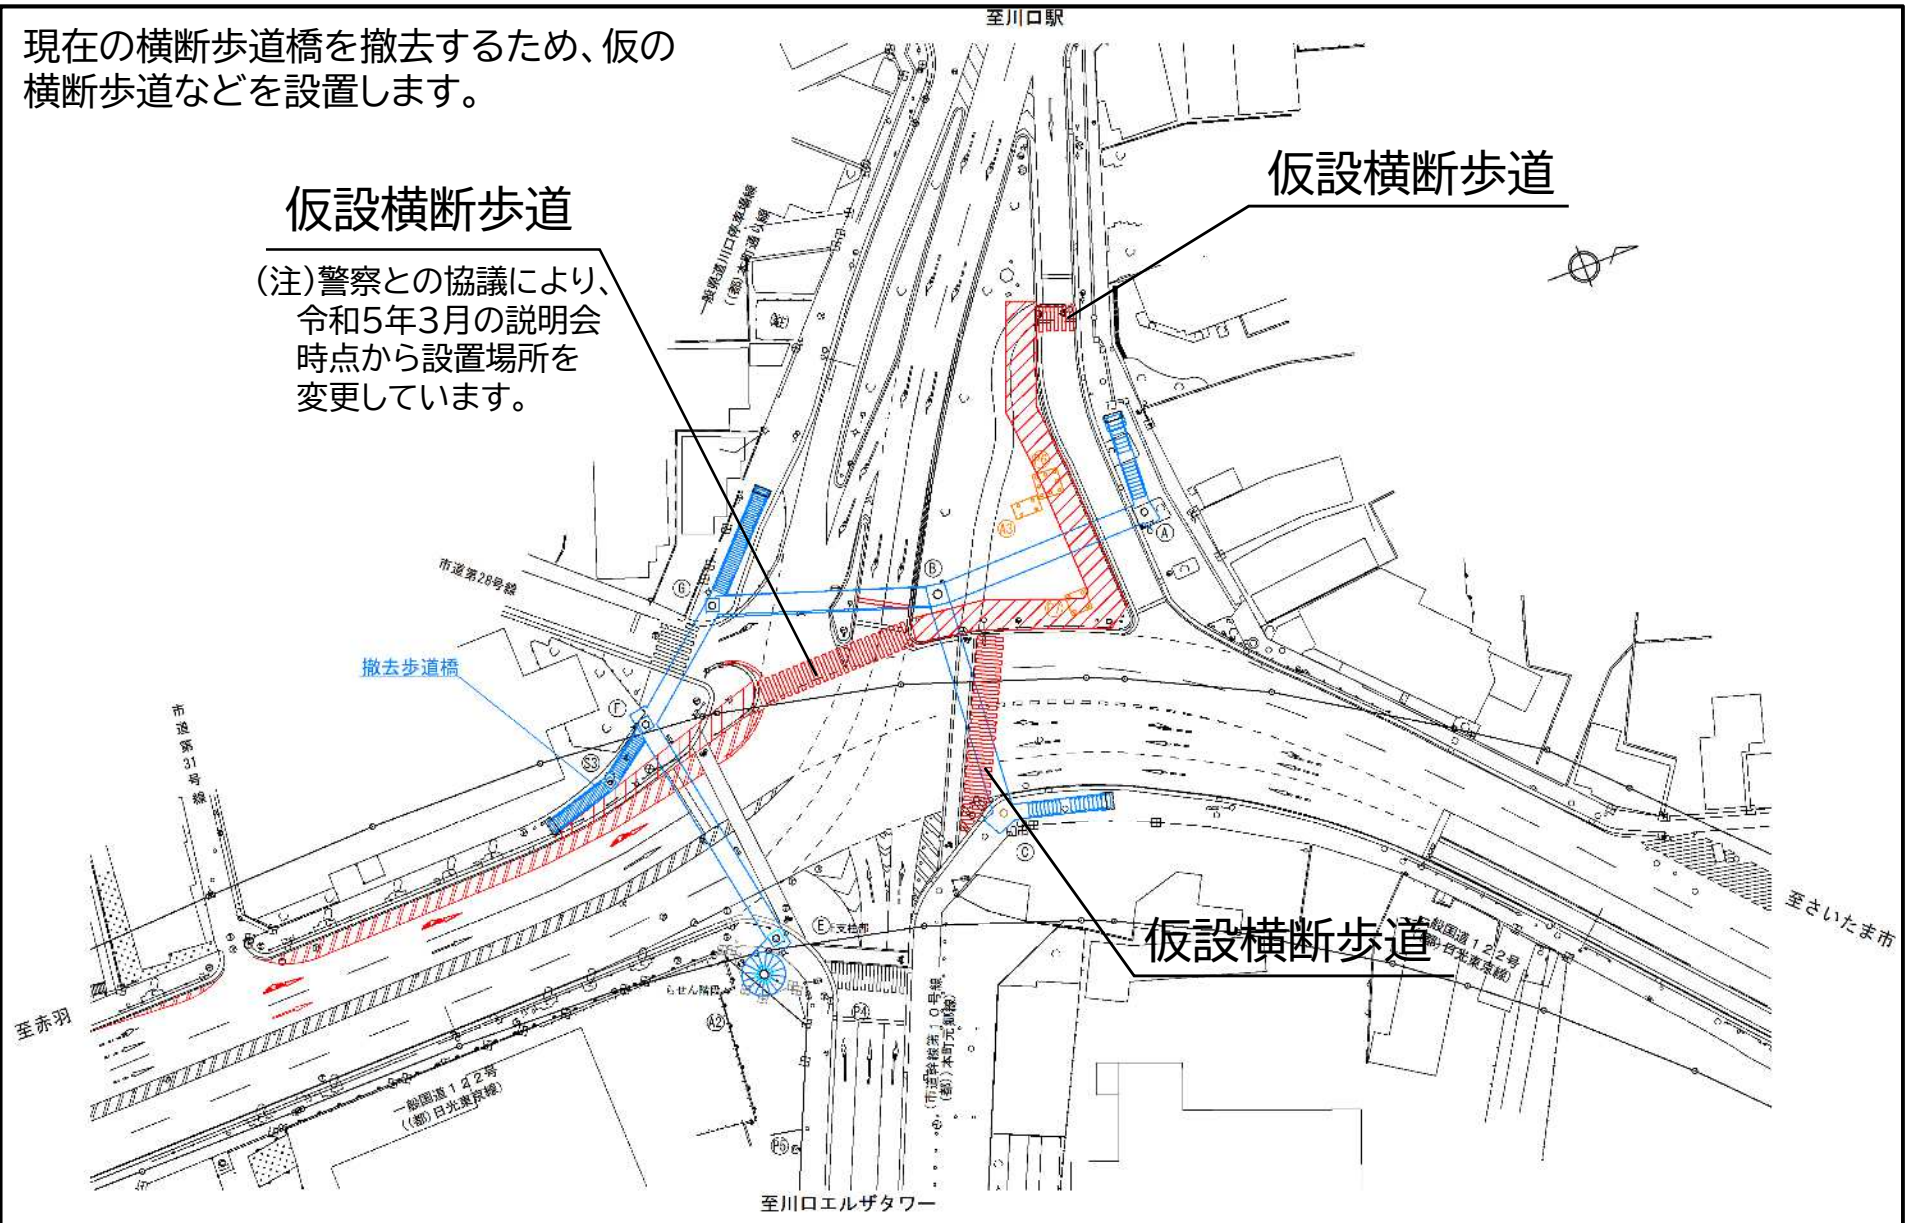

# ステップ4: 歩道橋の撤去(更新)

施工予定時期: R6年4月上旬～10月下旬

現在の横断歩道橋を順次撤去します。  
必要に応じ、安全確保のため、車道を  
適宜通行止めになります。

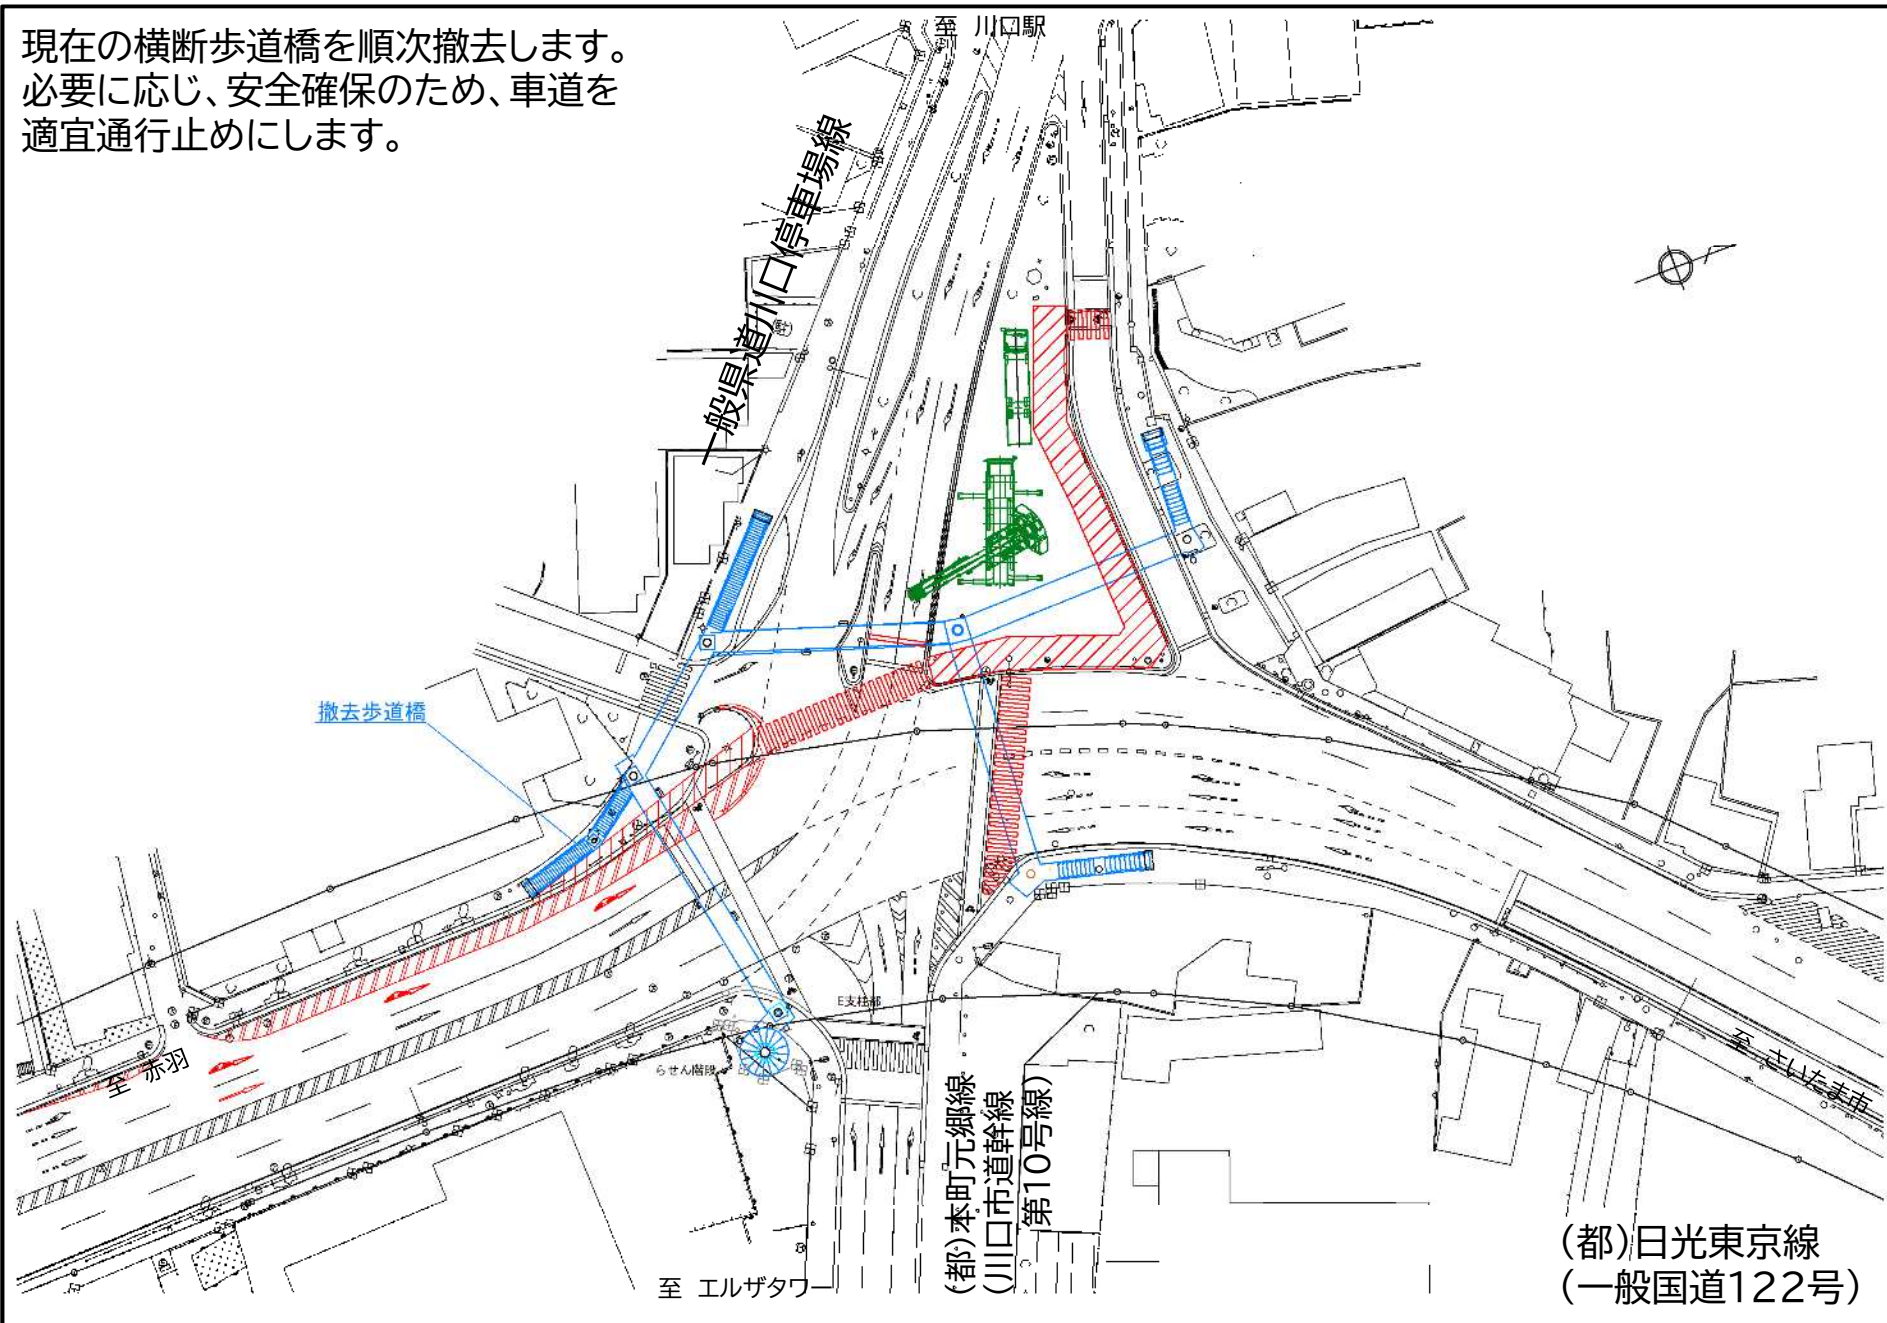






# ステップ6: 下部工完成(更新)

施工予定時期: R7年 10月頃


新しい横断歩道橋の基礎の完成です。  
引き続き、橋(橋桁、橋脚)の工事に  
移行します。

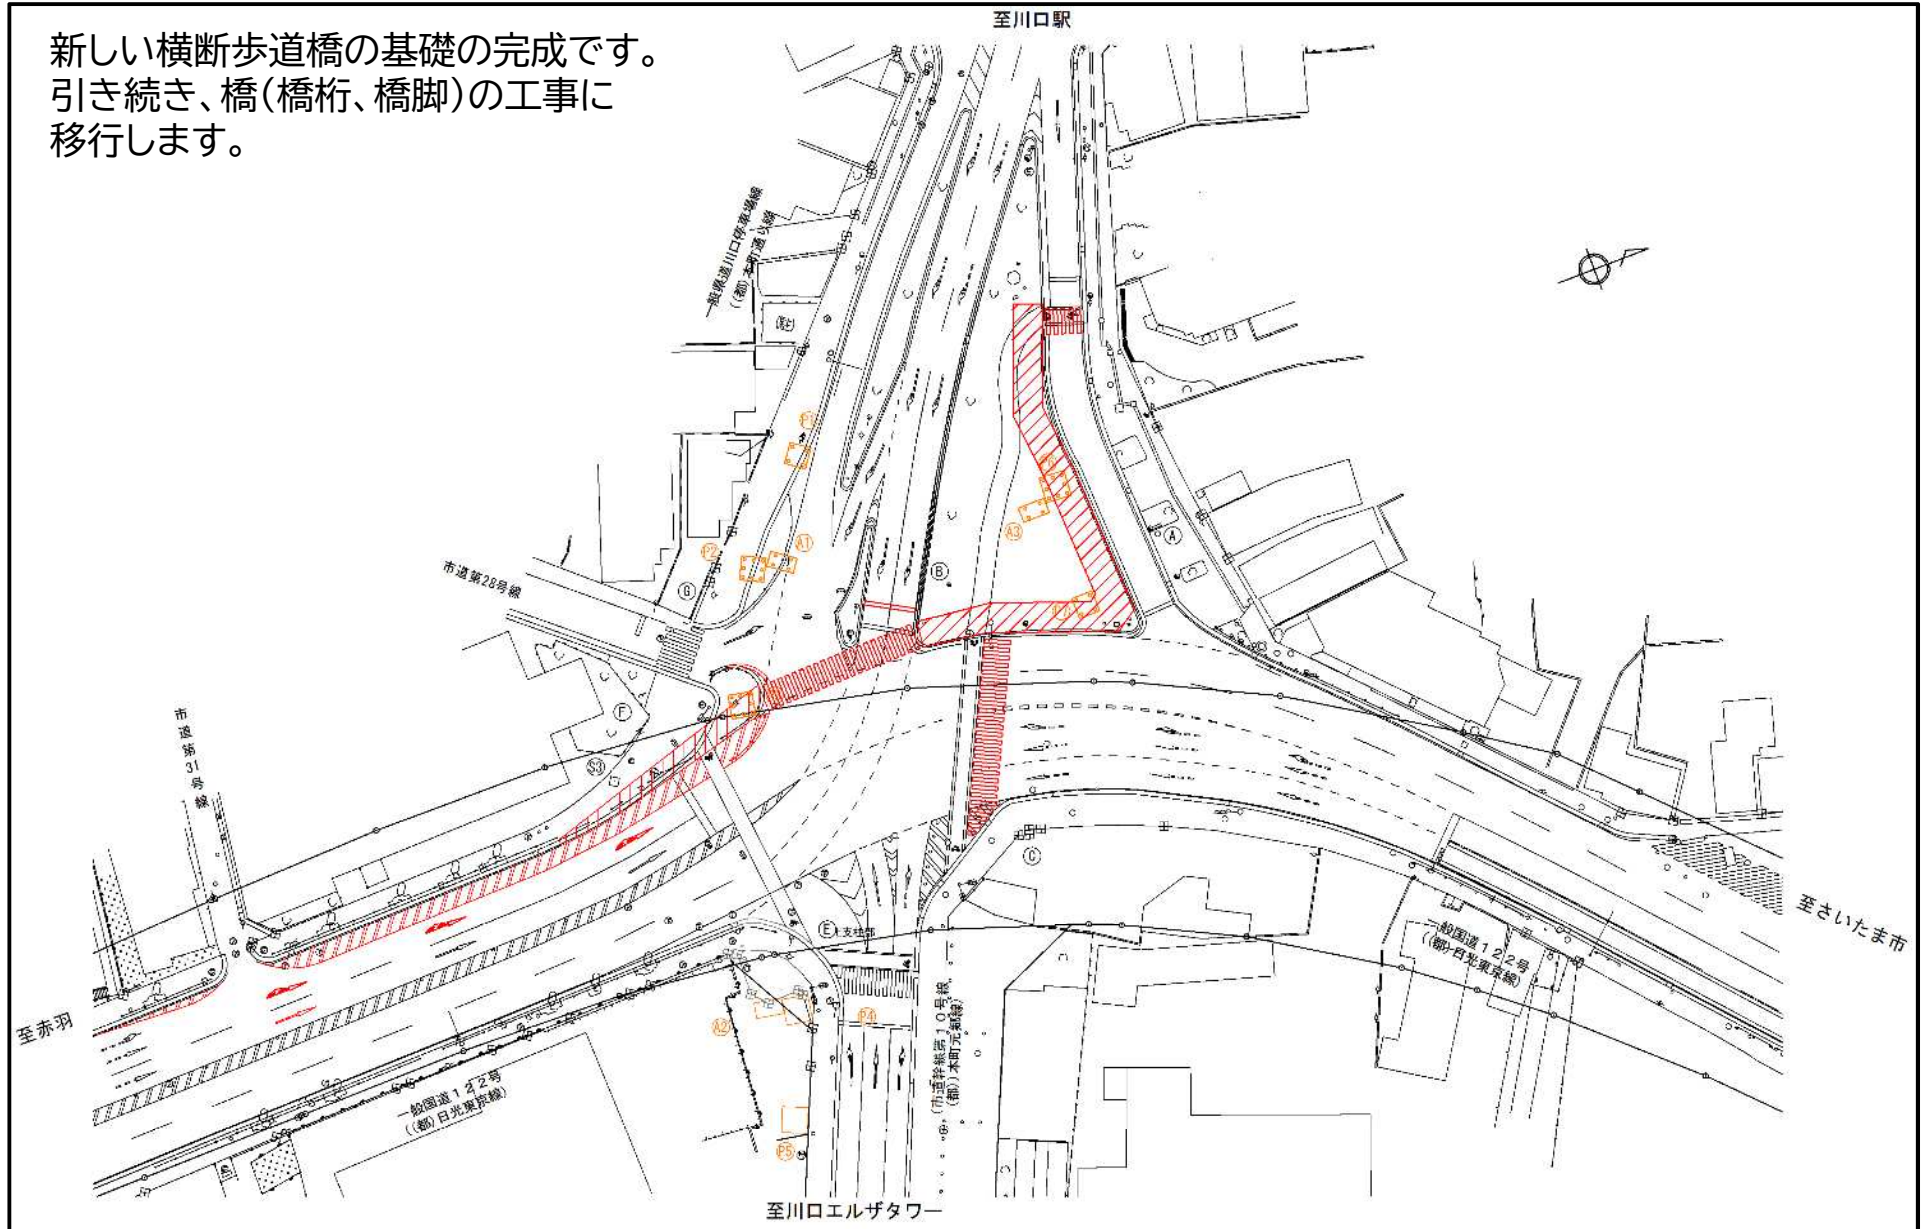

# ステップ7: 歩道橋完成(更新)


施工予定時期: R8年 3月頃

新しい横断歩道橋の完成です。  
引き続き、電線地中化工に着手します。

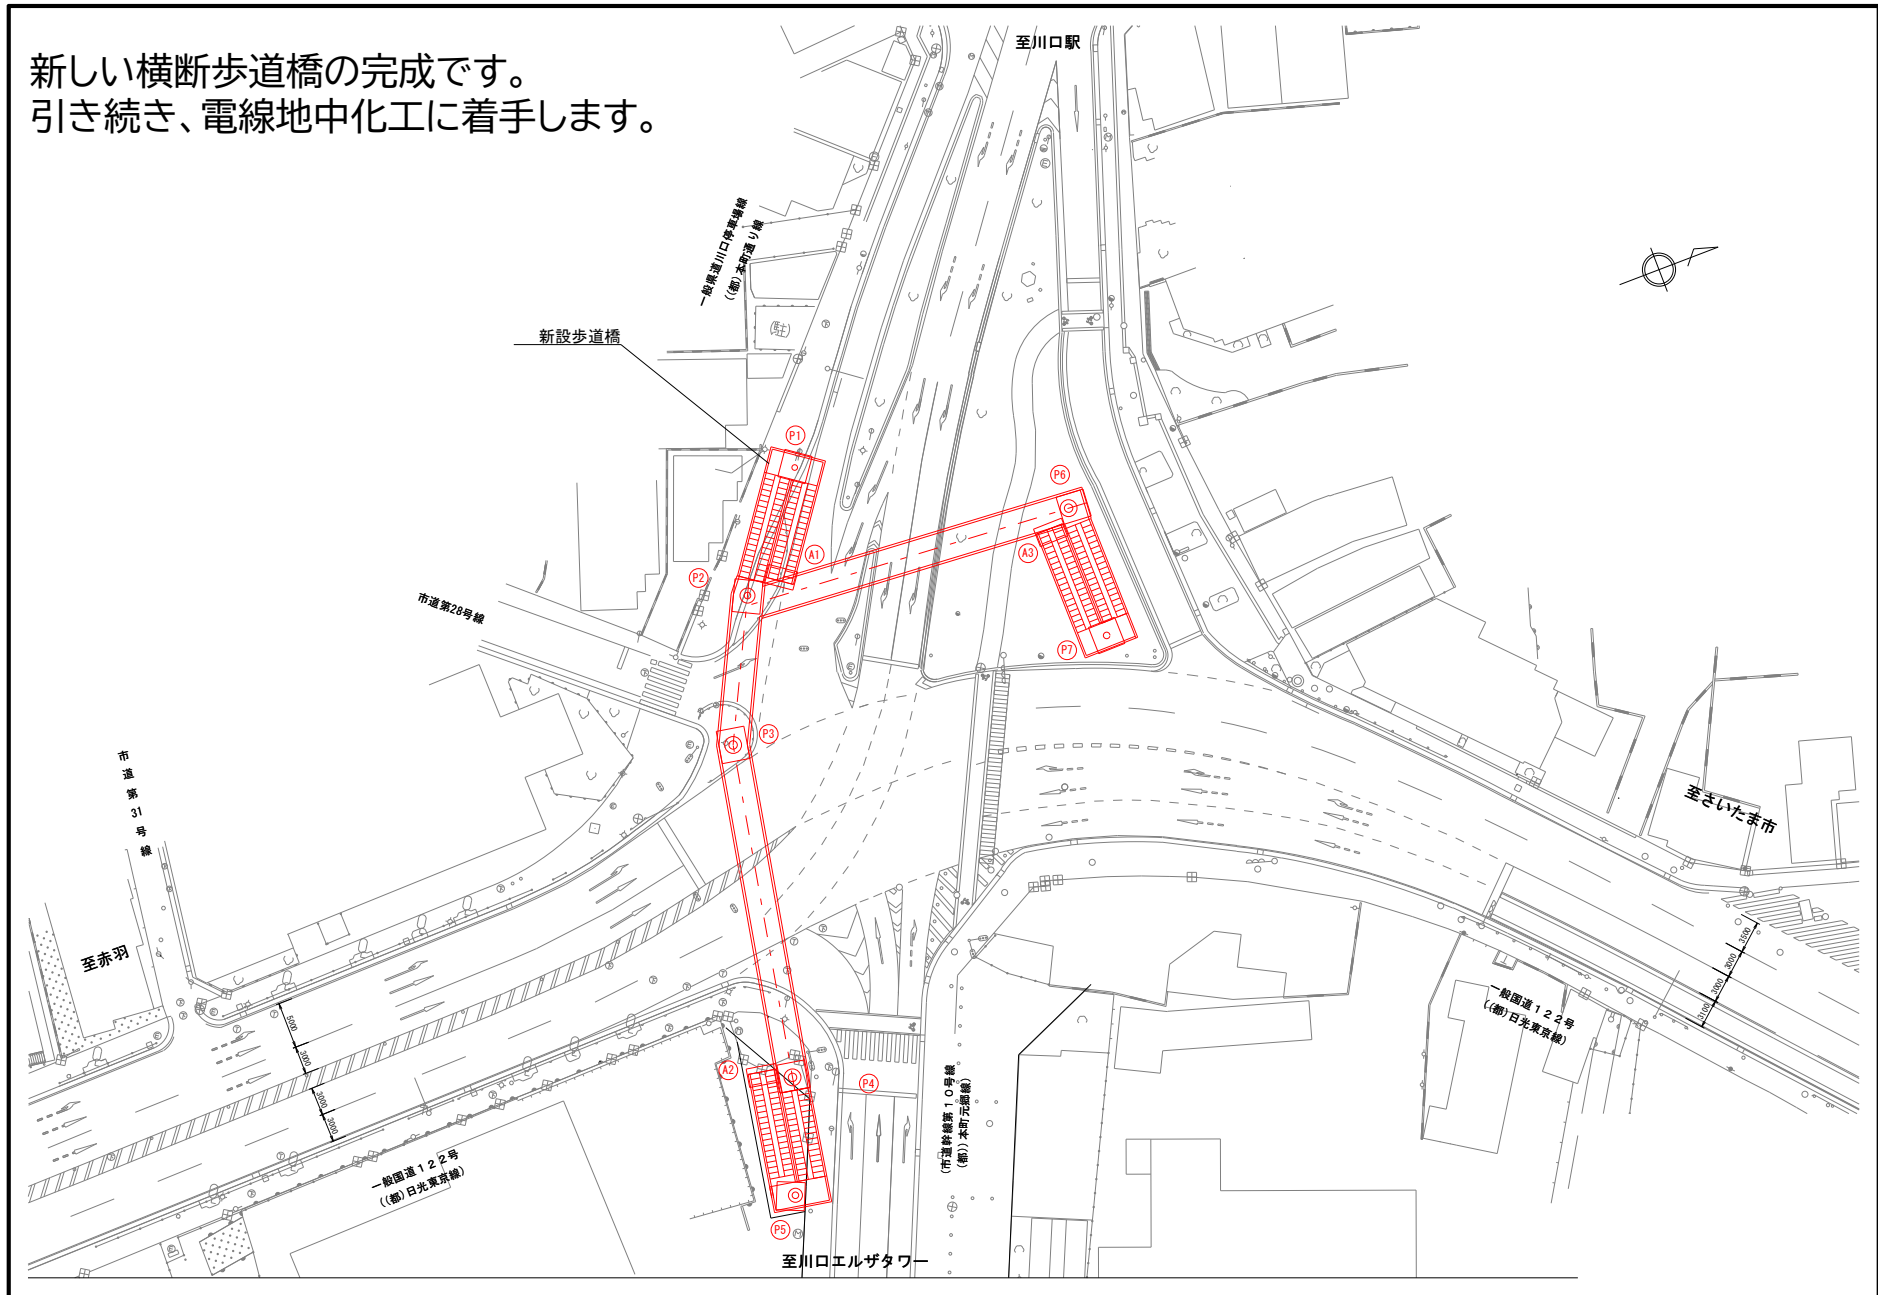



# 横断歩道橋 工事工程表(更新)

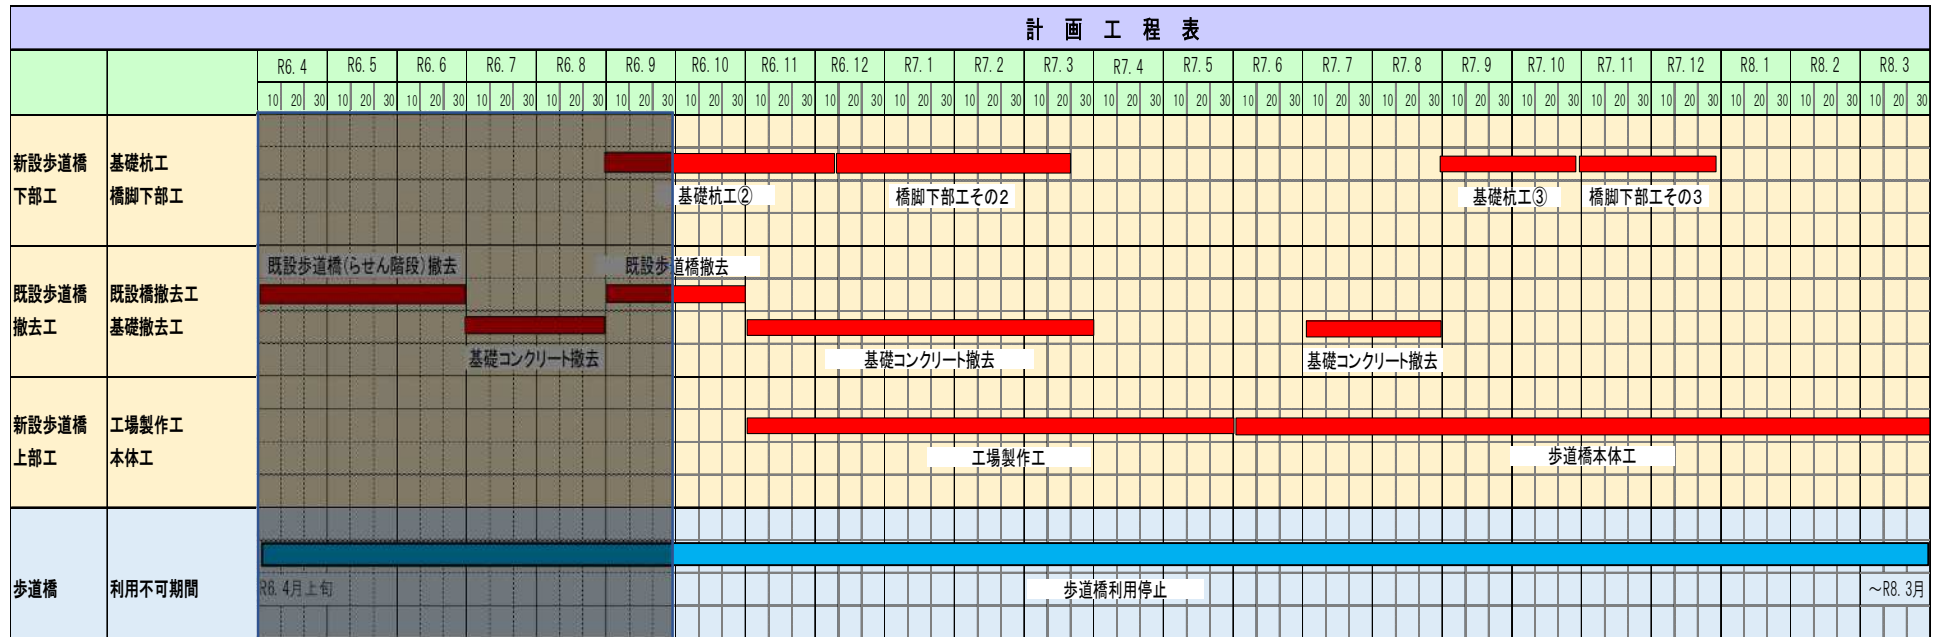

終了

(注)当初想定できなかった既設埋設物の処置等により、工事が遅延しています。  
今後も、用地買収の進捗等により、スケジュールを見直す場合があります。
