

秩父陸橋平面化事業の進捗状況について



秩父陸橋の概要

橋 長:31.80m(3径間)

幅 員:11.35m

年 次:昭和32年竣工(67年経過)

点 検:健全度Ⅲ判定(H29実施)
区分Ⅲ:早期措置段階

その他:第一次特定緊急輸送道路



平成 8年 秩父太平洋セメント引込線を廃止


平成30年 秩父陸橋の早期撤去の要望 (上野町町会、上宮地町会から秩父市へ)

R140 秩父陸橋平面化に関する要望 (秩父市から秩父県土へ)

平面化要望を受け、平成30年度から事業着手
秩父市のまちづくりに寄与・秩父陸橋の維持管理費を縮減

進捗状況 (令和7年9月末時点)

陸橋撤去完了



工事スケジュール

内容	年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
迂回路工事		→ R6.10				
陸橋撤去工事			→ R7.9			
支障移設			→ R8.3			
道路工事				→ R9.3		
無電柱化工事				→ R9.3		
交差点工事					→ R10.3	
地中配線工事					※迂回路撤去を含む	
電線管理者						※配線工事完了後、既存電柱抜柱

状況写真

迂回路設置完了
陸橋撤去着工前



擁壁部撤去中



擁壁部撤去完了



本体部撤去完了



本体部撤去中



本体部撤去前



撤去工法
(油圧による静かな工法で
騒音・振動を抑制)

① 橋体を削孔



② 油圧機を挿入




③ 油圧機でひび割れを誘発・破砕



今後の工事イメージ

無電柱化(電線共同溝形式)工事を行いながら、国道140号本線や交差点などの道路工事を進めていきます。

電線共同溝イメージ

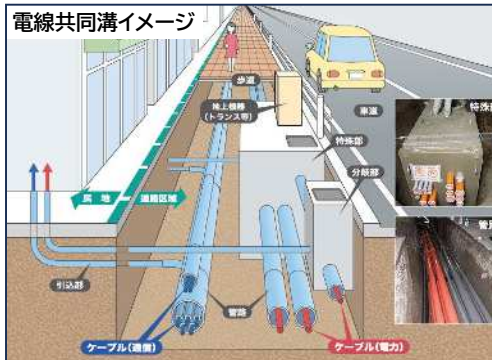


道路工事イメージ




道路横断面図

横断面図 (特殊部)




横断面図 (一般部)

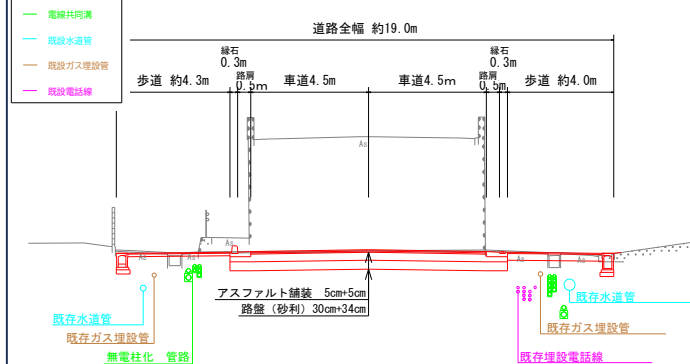



Before

秩父陸橋撤去
無電柱化
の実施

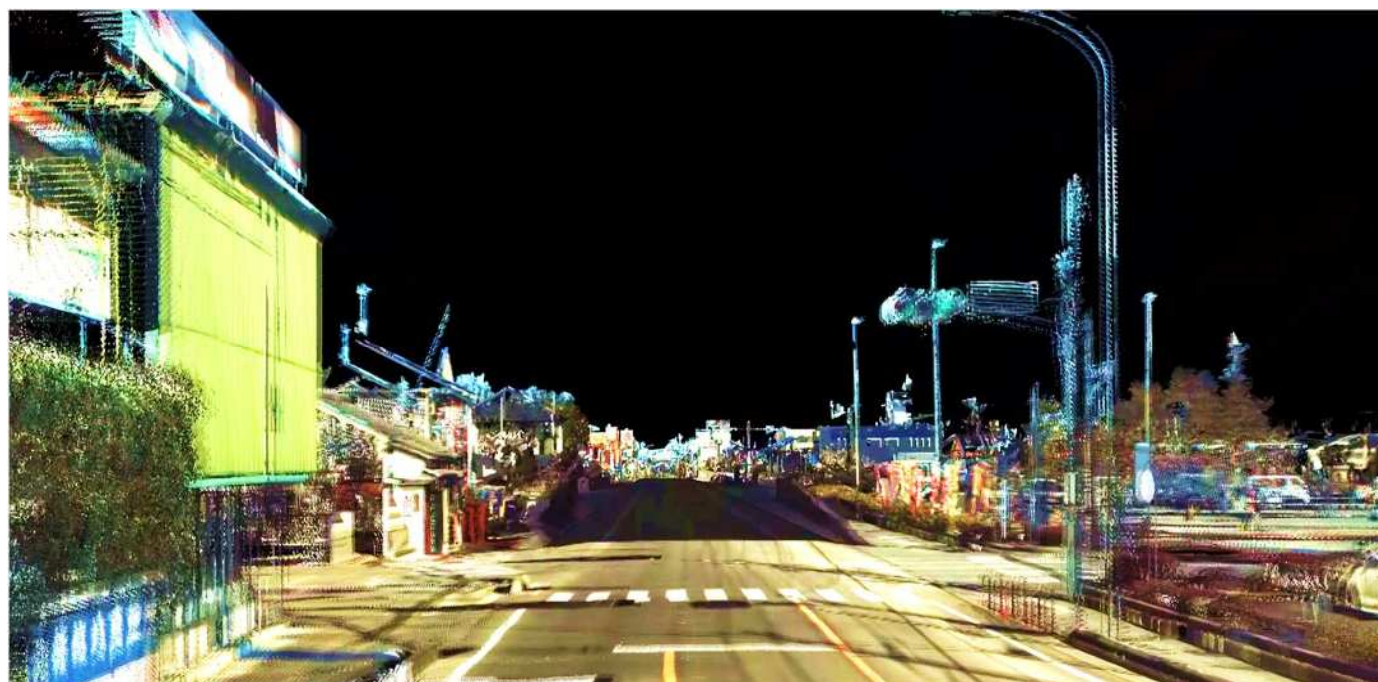

After
