


大滝トンネル 工事情報通信



残暑厳しい毎日ですが、朝夕は虫の音も聞こえ少し過ごしやすくなりました。皆さんはお変わりありませんか。大滝トンネル工事も掘削が1,560m進み、残り500mを切りました。地質も大きな変化はなく安定した状態です。覆工（仕上げのコンクリート）は430mを超え、順調に進んでいます。皆さんの協力には感謝申し上げます。

小学校の夏休みも終わり2学期が始まりましたので、より一層安全運転に心がけ進めますのでこれからもご協力をお願いします。

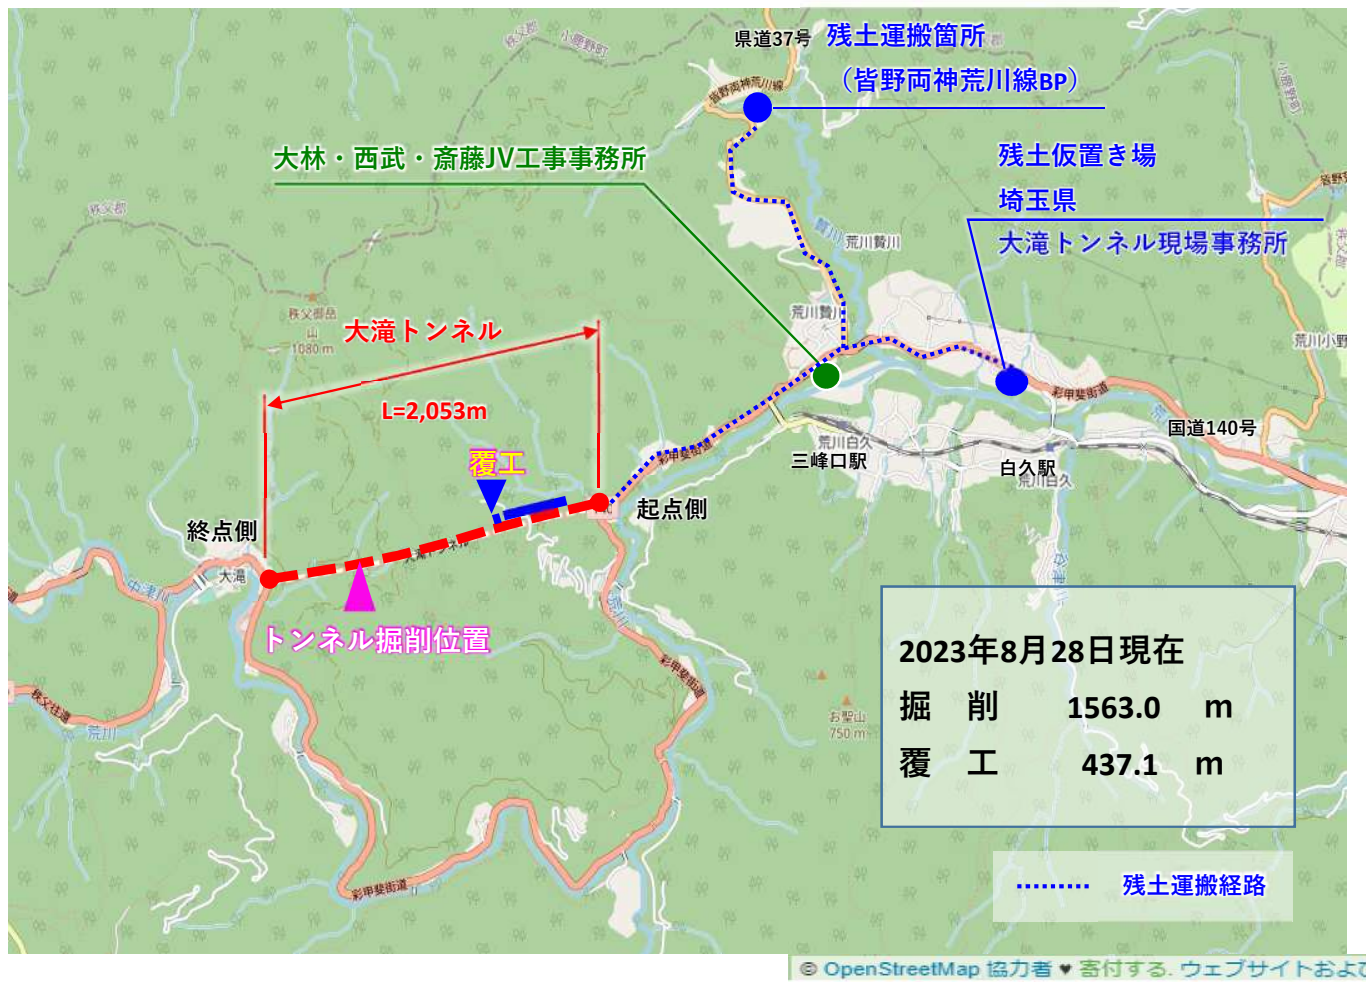

問合せ先

大滝トンネル事業全体
に関するお問い合わせはこちら

埼玉県西関東連絡道路建設事務所
住所：秩父郡皆野町皆野2511-1
TEL：0494-62-5811
担当：小林、宮城、中村

大滝トンネル本体工事
に関するお問い合わせはこちら

大林・西武・斎藤JV工事事務所
住所：秩父市荒川贄川 703-1
TEL：0494-26-6371
担当：古家、小野寺、古本

工事の進捗状況及び、今後の予定

トンネル掘削は、9月及び10月も継続して掘削を進めていきます。概ね140m/月を予定しています。覆工コンクリートは、9月に非常駐車帯の取合い部を施工することから36m程度を打設する予定です。10月は150m程度打設する予定です。

トンネル掘削で発生した残土は、皆野両神荒川線バイパスへ運搬します。

トンネル進捗写真



トンネル掘削
トンネル入口より1560m付近を掘削しています。右側写真は（吹付けコンクリート作業中）です。

覆工
標準断面部が437m進みました。右写真は非常駐車帯（故障車等が退避する場所）取合い部を施工している所です。



残土運搬
トンネル掘削で発生したズリは、古池地区の『皆野両神荒川線バイパス』へ残土運搬しています。



上り線・下り線に箱抜きを設置し将来消火栓等が付きます。
