

中太田・小柱地区の概要

（令和7年3月作成）

1 地区の状況等

本地区は、秩父市の北部に位置し、未整備の畑地帯である中太田工区と、昭和57年から61年度にかけて団体営土地改良総合整備で整備された水田地帯である小柱工区からなる。

中太田工区内ではナス、きゅうりなどの作物を生産しており、小柱工区では水稻が主な作付けである。本事業により、中太田工区の区画整理と小柱工区の暗渠排水等の整備を行い、品質の安定と収量の増加を図る。


2 事業の概要

- (1) 事業名 ほ場整備事業（中山間型）
- (2) 受益面積 17.2ha（田13.0ha、畑4.2ha）
- (3) 事業期間 令和元年度～令和6年度（予定）
一部令和7年度への繰越あり
- (4) 総事業費 239,700千円（事務費除）
- (5) 負担区分（中太田）国50%、県27.5%、市22.5%
（小 柱）国50%、県27.5%、市10%、農家12.5%
- (6) 総事業量（中太田）区画整理 A=4.2ha、換地 1式
（小 柱）暗渠排水 A=11.9ha、
幹線パイプライン L=1.0km
- (7) 関係市町村及び土地改良区、地元推進組織等
市 町 村：秩父市
土地改良区：無し
推進組織等：小柱土地改良組合、中太田土地改良組合

3 事業の実施状況

年度	令和5年度まで	令和6年度
実施内容	区画整理 4.2ha 幹線パイプライン 1.0km 暗渠排水 11.9ha 換地 1式	付帯工 1式
予算	204,470千円	35,200千円
進捗率	85.3%	100%

中太田地区 計画平面図

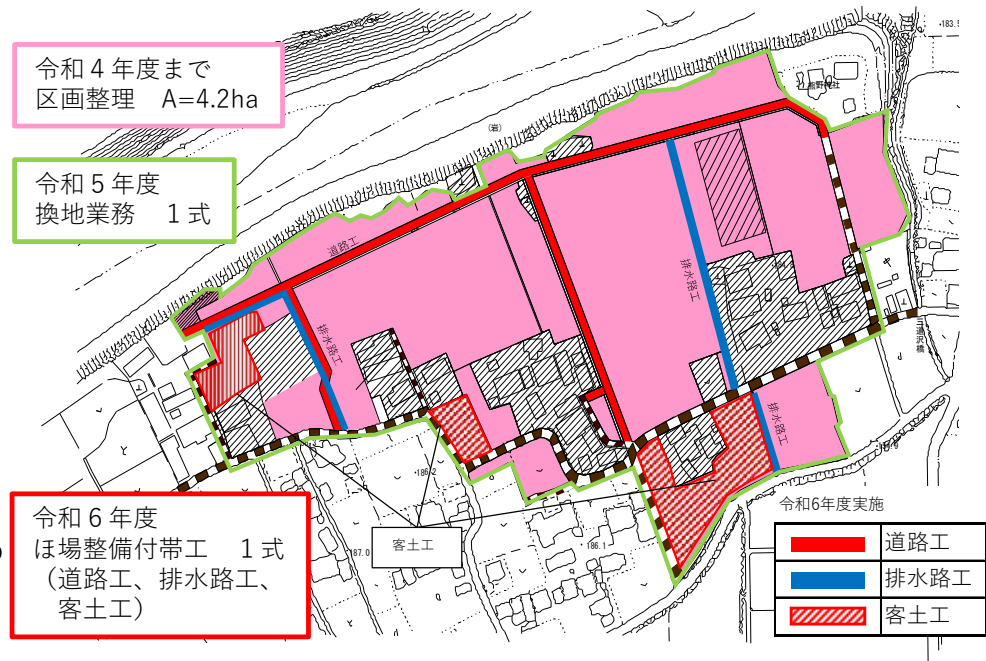


排水路工実施後（令和7年2月末時点）



客土工実施後（令和7年2月末時点）



小柱地区 計画平面図

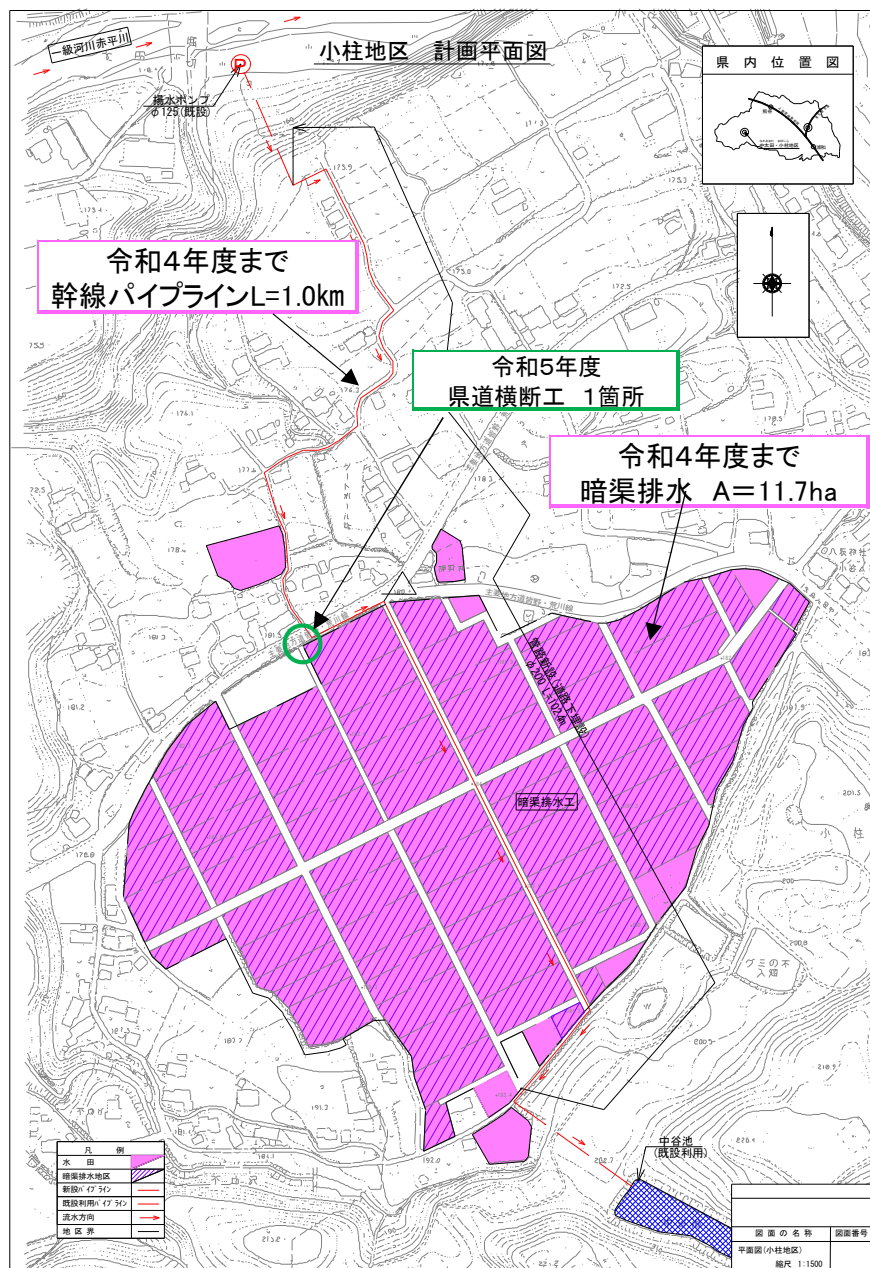

暗渠排水工実施状況



幹線パイプライン実施状況



4 農地集積等計画

R5実績		現状(R6末見込)		目標(R10)	
経営面積	担い手数	経営面積	担い手数	経営面積	担い手数
6.88ha	1人(認定農業者)	9.26ha	2法人 1人(認定農業者)	11.0ha	1法人
